МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота №5

З дисципліни «Управління ІТ-проектами »

Виконав:

студент групи КН-415

Лозовий Олег

Викладач:

Доцент кафедри СШІ

Вовк О.Б.

Львів – 2024 р.

Тема: планування та побудова «дорожньої карти» проєкту.
побудова матриці відповідальності та
комунікаційної матриці проєкту.
побудова діаграми ганта.

Мета: ознайомитись з основними підходами до побудови «дорожньої карти» (контрольного списку) проекту. Навчитись чітко, лаконічно та однозначно формулювати його у відповідності до поставлених в проекті задач. Ознайомитись з таким елементом в управлінні проектами як Матриця комунікації (Комунікаційна матриця) та на практиці засвоїти принципи її побудови. Вміти будувати діаграму Ганта у відповідності до «дорожньої карти» проекту.

Завдання:

На основі викладеного теоретичного матеріалу та попередньо виконаних лабораторних робіт в рамках модельованого проекту, сформувати:

- Контрольний список планування проекту;
- WBS;
- Мережеву діаграму;
- «рух вперед» та «зворотний рух»;
- Матрицю комунікації;
- часову візуалізацію термінів виконання проектів за допомогою діаграми Ганта.

Проєкт: Система визначення назви страви за її зображенням.

Контрольний список планування проєкту

	Крок проекту	Опис кроку проекту	Вхідні дані	Вихідні дані (результат)	Коментарі
1.	Визначення ідеї	Розробити опис ідеї проекту		Договір сформована ідея	Що? Коли? Як багато? Для кого? Де?

2.	Визначення об’єму робіт	Визначити чіткий об'єм роботи та розбити його на певні етапи	Договір про загальний об’єм роботи	Етапи виконання повного об’єму	Як багато? Скільки етапів? За скільки часу?
3.	Оцінка часу виконання	Оцінити приблизний час необхідний для кожного етапу	Список етапів та час необхідний для кожного	Затверджений час виконання на кожен етап	Скільки? Як довго?
4.	Аналіз конкурентів	Підбір конкурентів, та аналіз їх робіт	Список потенційни х використані	Основні мінуси та плюси конкурентів	Скільки? Що саме робили?
5.	Аналіз потужностей	Оцінити витрати на проект, потенційні обчислювальні потужності, необхідні матеріали	Список необхідного	Виділення необхідного бюджету та часу	Варто врахувати тривалість проект, щоб знати скільки тре виділити на персонал
6.	Визначення ризиків	Визнати усі можливі ризики	Список ризиків	Визначення ризиків, які можуть виникнути	Які? На скільки реальні?
7.	Планування якості проекту	Визначити мінімальний поріг якості для кожного етапу	Список етапів	Встановленні вимоги щодо якості виконання кожного етапу	Яка? На скільки велика? Мінімальн а?


8.	Планування комунікації	Визначити відповідальних за комунікацію та описати сам процес комунікації		План управління комунікації на проекті	Як? Що? Кому? Коли?
9.	Створення моделі	Створити модель		Модель	Оптимізація, точність
10.	Створення інструменту інтеграція	Створити інструмент інтеграція		Інструмент інтеграції	Швидкодія, легкість інтеграції
11.	Тестування	Провести тестування	Модель та інструмент інтеграції	Проведене тестування та (можливо) знайдені помилки	Варто провести хороше тестування для знаходження критичних помилок
12.	Виправлення помилок	Варто виправити помилки, знайдені на етапі тестування	Помилки	Виправленні помилки	Скільки? Як довго?

13.	Проведення оптимізації	Провести оптимізацію сайту для різних девайсів	Модель та інструмент інтеграції	Оптимізований сайт	Як довго?
14.	Створення документації та презентації	Створити документацію та презентацію для захисту	Модель, інструмент інтеграції, результати тестів	Презентація, звіт	
15.	Закриття проекту	Закрити проект і захистити його у екзаменаційної комісії	Готовий проект	Фідбек	Чи задоволені ?

WBS




Мережева діаграма

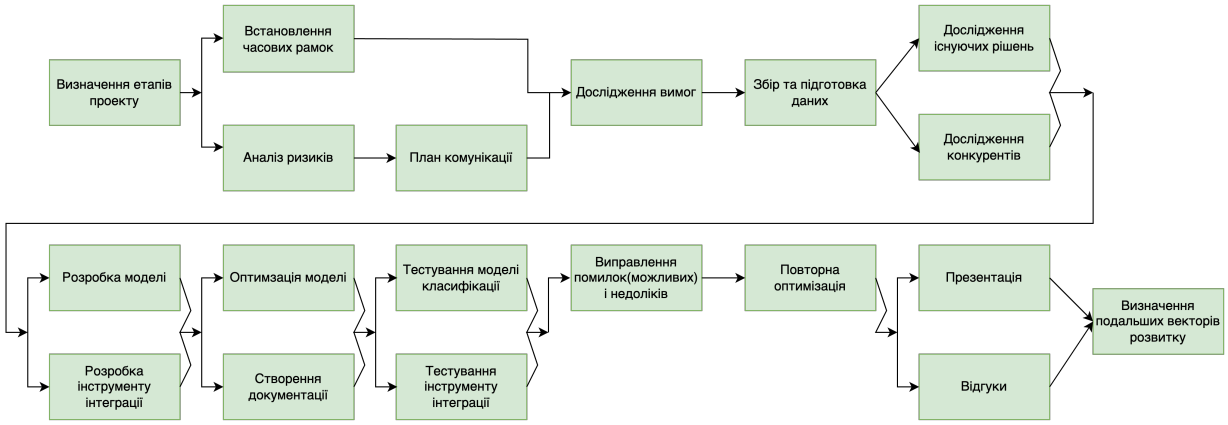

«Рух вперед»


«Рух назад»

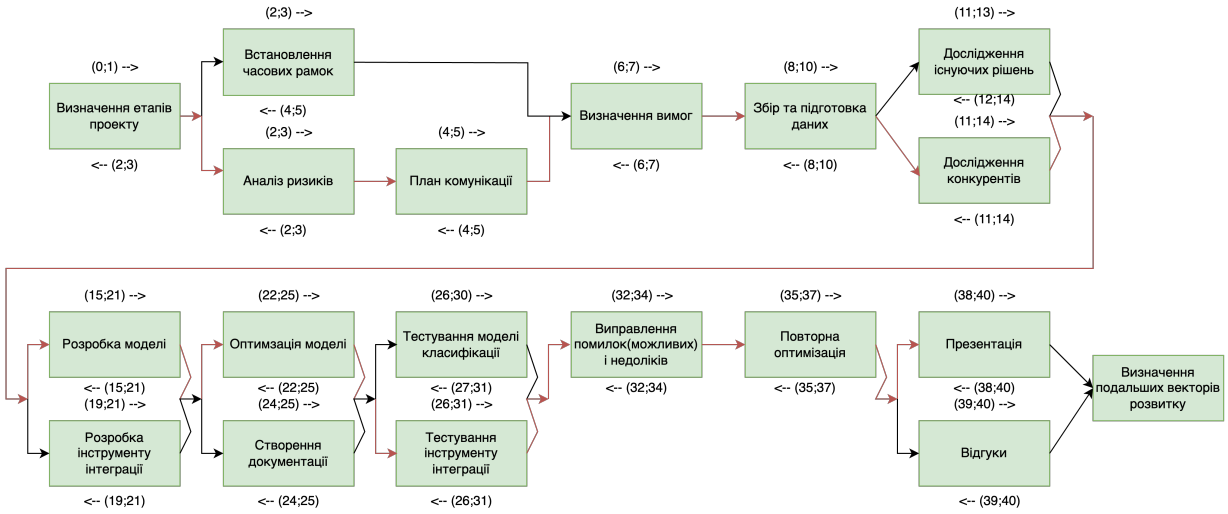

Матриця комунікацій

Аудиторія	Повідомлення	Тип комунікації	Частота
Екзаменаційна комісія	Презентація готового продукту	Звіт усний і письмовий	Одноразово
Науковий керівник	Стан роботи, оновлення/важливі зміни, звіти, нові завдання	Онлайн зустрічі, месенджер	Щотижнева, за потреби
Сторонні розробники	Оновлення даних проєкту, важливі зміни	Текстові	За потреби
Майбутні користувачі	Демо проекту, основні фішки та особливості	Текстові	За потреби

Діаграма Ганна

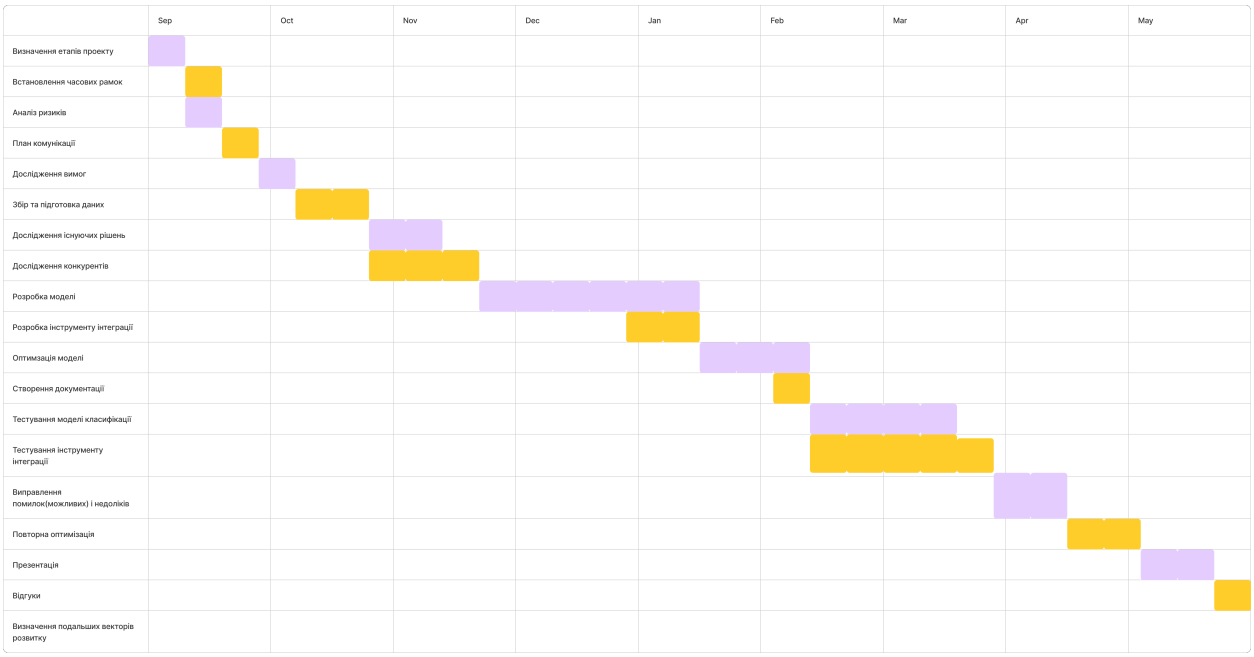

Висновок: під час виконання даної лабораторної роботи, я ознайомився з основними підходами до побудови «дорожньої карти» (контрольного списку) проекту, навчився чітко, лаконічно та однозначно формулювати його у відповідності до поставлених в проекті задач, ознайомився з таким елементом в управлінні проектами як Матриця комунікації (Комунікаційна матриця) та на практиці засвоїв принципи її побудови.
